

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL



Objetivo general:

Mejorar la oferta de servicios de gestión y colocación de la red de prestadores del SPE en atención a víctimas

Código BPIN: 2018011000184

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Entidad: Uaespe


Responsable: Evelin Pena Alvarez

Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2022: \$ 6.300.138.552

Control Posterior: 27/05/2022

Seguimiento de: abril 2022

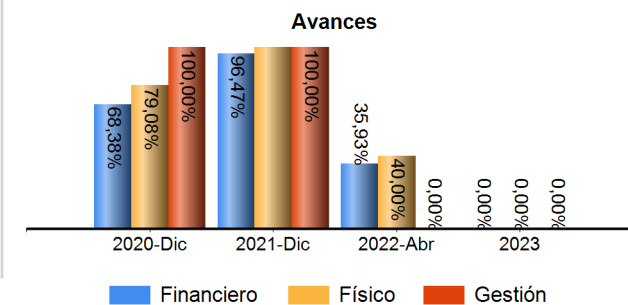

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar lineamientos a la red de prestadores en atención diferencial a población víctima

PRODUCTOS

Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	80,0000	0,0000	10,0000	7,0000	70,00 %

Observaciones : Se realizó un evento durante el mes de abril, Día de conmemoración y solidaridad con las Víctimas

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima	PGN	\$271.586.738	\$271.586.738	\$44.185.363
Capacitar y acompañar a los centros de empleo en la implementación de la ruta de atención diferencial de empleabilidad	PGN	\$1.030.000.000	\$1.030.000.000	\$418.117.130
TOTAL		\$1.301.586.738	\$1.301.586.738	\$462.302.493

Fortalecer las estrategias para la mitigación de las barreras en población víctima.

SPI detalle de proyecto

julio,15, 2022 05:07 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de registro laboral

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Registros laborales realizados - Unidad de Medida: Número	694.778,0000	0,0000	155.877,0000	50.534,0000	32,42 %
Observaciones : El reporte realizado corresponde al mes de marzo, dado que el sistema presenta rezago de información.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar las barreras que impiden a las víctimas el acceso a programas de empleo	PGN	\$882.307.662	\$882.307.662	\$188.813.950	
Mitigar las barreras de la población víctima a través de servicios especializados realizados	PGN	\$4.116.244.152	\$4.116.244.152	\$1.612.325.074	
TOTAL		\$4.998.551.814	\$4.998.551.814	\$1.801.139.024	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.599.114.204	5.765.519.249	5.765.519.249	5.732.221.969	5.525.287.023	5.128.528.939	Financiero 95,83%  Físico 84,00%  Gestión 122,00% 
2020-Dic	6.116.639.371	5.938.484.826	5.938.484.826	5.899.222.263	4.060.777.233	4.060.777.233	Financiero 68,38%  Físico 79,00%  Gestión 100,00% 

SPI detalle de proyecto

julio,15, 2022 05:07 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	6.143.290.160	6.116.639.371	6.116.639.371	5.990.469.354	5.900.738.441	5.900.157.438	Financiero 96,47% Físico 132,00% Gestión 100,00%
2022-Abr	6.327.588.865	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.227.750	2.263.441.517	2.263.441.517	Financiero 35,93% Físico 40,00% Gestión 0,00%
2023	6.489.432.523	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (2/05/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.227.750	2.263.441.517	2.263.441.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.227.750	2.263.441.517	2.263.441.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.227.750	2.263.441.517	2.263.441.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.227.750	2.263.441.517	2.263.441.517	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

SPI detalle de proyecto

julio, 15, 2022 05:07 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	6.300.138.552	6.300.138.552	6.300.138.552	6.300.138.552	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	1,21 %	33,94 %	35,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	10,00 %	22,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Víctimas	Reparación - Empleo	Aportes Nacion	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.020.156	2.138.496.618	2.138.496.618
Total			6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.020.156	2.138.496.618	2.138.496.618
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	Aportes Nacion	1.105.461.108	1.105.461.108	1.105.461.108	0	0
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	Aportes Nacion	1.105.461.108	1.105.461.108	1.105.461.108	0	0
Total			1.105.461.108	1.105.461.108	1.105.461.108	0	0

SPI detalle de proyecto

julio, 15, 2022 05:07 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Departamentos Intervenido	27	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	6.300.138.552	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	35,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	60,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.020.156	2.263.441.517	2.263.441.517
---Por Regionalizar	6.300.138.552	6.300.138.552	6.170.020.156	2.263.441.517	2.263.441.517

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL -
2018011000184
